


合同段: ZB1

编号:

工程项目	桥梁工程
工程地点及桩号	K2+074.0芋河沟大桥右线0#桥台0-1#钻孔灌注桩
具体部位	成孔检查
检验内容	孔深、孔径、孔位
要求到现场检验时间：2024年04月10日	
承包人递交日期、时间和签字：2024年04月10日 	
监理员收件日期、时间和签字：2024年04月10日 	
质量证明附件： JL8145钻孔桩钻孔施工原始记录表 JL8155钻（挖）孔桩基坑地质钻探检查记录表 JL818桥梁桩基终孔验收记录表 CL10平面位置检测记录表 CL08水准测量记录表	
监理员意见： 符合设计及规范要求 签字：  2024年04月10日	
专业监理工程师意见： 符合设计及规范要求 签字：  2024年04月10日	
承包人收到日期： 签字：  2024年04月10日	

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗
段改线工程）EPC 总承包
钻孔桩钻孔施工原始记录表

承包单位：中国五冶集团有限公司

合同段：ZB1

监理单位：北京建大京精大房工程管理有限公司

编 号：

工程名称	K2+074.0芋河沟大桥右线			桩位编号	0-1#	
钻孔底高程（m）	设计：	366.533	护筒顶高程(m)	384.059		
	实测：	366.355				
钻孔深度（m）	设计：	17.522	设计桩径(m)	1.3		
	实测：	17.7	设计桩长（m）	15.5		
钻机型号	XR240E			钻头形式、直径	旋挖钻、1.3m	
交接班起止时间	本班进尺（m）	累计进尺（m）	地质情况	泥浆比重（g/cm³）	孔径检查	现场负责人
自 10日 07时11分 至 10日 08时06分	5.2	5.2	粉质粘土	/	合格	彭俊杰
自 10日 08时06分 至 10日 08时30分	1.6	6.8	强风化砂质泥岩	/	合格	彭俊杰
自 10日 08时30分 至 10日 09时35分	4.3	11.1	中风化砂质泥岩	/	合格	彭俊杰
自 10日 09时35分 至 10日 10时41分	4.5	15.6	中风化砂质泥岩	/	合格	彭俊杰
自 10日 10时41分 至 10日 11时23分	2.1	17.7	中风化砂质泥岩	/	合格	彭俊杰
自 至						
自 至						
自 至						
自 至						
自 至						
备注： 符合设计及规范要求						

记录：彭俊杰

监理员：夏科

2024年04月10日

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包


钻（挖）孔桩基坑地质钻探检查记录表

承包单位：中国五冶集团有限公司

合同段：ZB1

监理单位：北京建大京精大房工程管理有限公司

编 号：

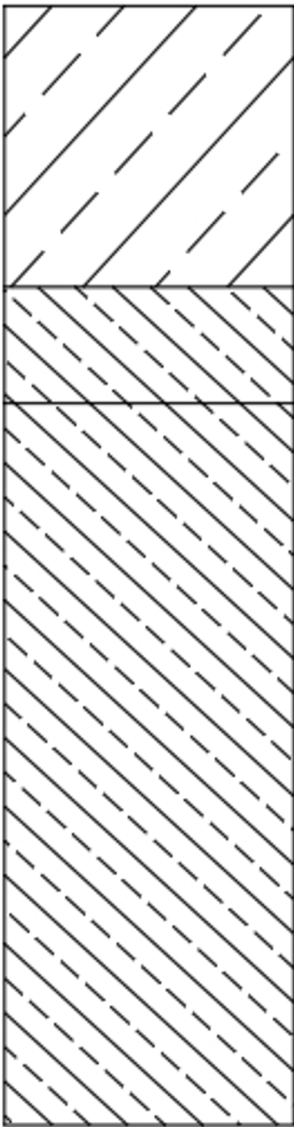工程名称		K2+074.0 芋河沟大桥右线		施工时间		2024年04月10日	
桩号及部位		K2+074.0 芋河沟大桥右线0#桥台0-1#钻孔灌注桩		检验时间		2024年04月10日	
墩台号		0#台		桩孔号		0-1#	
护筒高程 (m)	384.059	钻孔直径 (mm)	1340	钻孔深度 (m)	17.7	孔底高程 (m)	366.355
层底高程 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	地质柱状图		岩土名称及特征		
378.855	5.2	5.2			粉质粘土		
377.255	6.8	1.6			强风化砂质泥岩		
366.355	17.7	10.9			中风化砂质泥岩		
结论： 符合设计及规范要求							

记录：

张明

监理员：

夏科

2024年04月10日

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包

桥梁桩基终孔验收记录表

承包单位：中国五冶集团有限公司

合同段：ZB1

监理单位：北京建大京精大房工程管理有限公司

编 号：

桥梁名称	K2+074.0芋河沟大桥右线		桩基编号	0-1#	
成孔类型	旋挖钻成孔		检验日期	2024年04月10日	
设计桩顶标高	382.033		护筒顶（锁口）标高	384.059	
设计桩底标高	366.533		实际桩底标高	366.355	
设计桩长（m）	15.5		孔深（m）	17.700	
设计孔径(m)	1.30	实际孔径（m）	1.34	孔位（mm）	30
设计地质描述情况	0-5.1m为粉质粘土，5.1-6.9m为强风化砂质泥岩，6.9m以下为中风化砂质泥岩。		实际地质描述情况	5.2m为粉质黏土，5.2-6.8m为强风化砂质泥岩，6.8m以下为中风化砂质泥岩。	
设计嵌岩情况	本桥桩基按摩擦桩设计		实际嵌岩情况	/	
施工单位意见	该桩基各项指标均满足《公路桥涵施工技术规范》JTG/T3650-2020及《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017，申请终孔。 签字：2024年04月10日				
总监办意见	经检验，各项指标满足设计及规范要求,同意终孔。 签字：2024年04月10日				
备注					

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包

平面位置检测记录表

施工单位：中国五冶集团有限公司

合同段：ZB1

监理单位：北京建大京精大房工程管理有限公司

编 号：

工程名称	K2+074.0芋河沟大桥右线				日 期	2024年04月10日		
桩号及部位	K2+074.0芋河沟大桥右线0#桥台0-1#钻孔灌注桩				天 气	小雨		
测站点	坐标（m）		后视点	坐标（m）				
	X	Y		X	Y			
X5	3290518.343	570339.799	X4	3290494.134	570501.611			
桩号及点位	设计坐标（m）		实测坐标（m）		差值（mm）		偏位（mm）	
	X	Y	X	Y	△X	△Y	$\sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2}$	
K1+893.950 2.588	3290456.309	570564.748	3290456.283	570564.763	-26	15	30	
测量方法及示意图：								
检查意见：								
符合设计及规范要求								

测量：志玲

记录：陈春鹏

复核：李进

测量专监：王群

日期：2024年04月10日

编号:

日期： 2024年04月10日
